


1. Netzplan (Vorgangsknotennetz) – Einrichtung PBS & Integration ODCF/DKFZ


Knotenformat oben: FAZ | Dauer | FEZ — unten: SAZ | GP | SEZ. Roter Rahmen & rote Pfeile = kritischer Pfad (GP=0, Gesamtdauer 28 h). Gestrichelte Pfeile = nicht-kritische Vorgänge. Orange GP-Wert = Puffer vorhanden. Parallel: Beschaffung+Doku nach Planung | Datastore+PVE-Integr.+Monitoring nach Installation.

Netzplan - Einrichtung PBS & Integration ODCF/DKFZ | Fachinformatiker Systemintegration

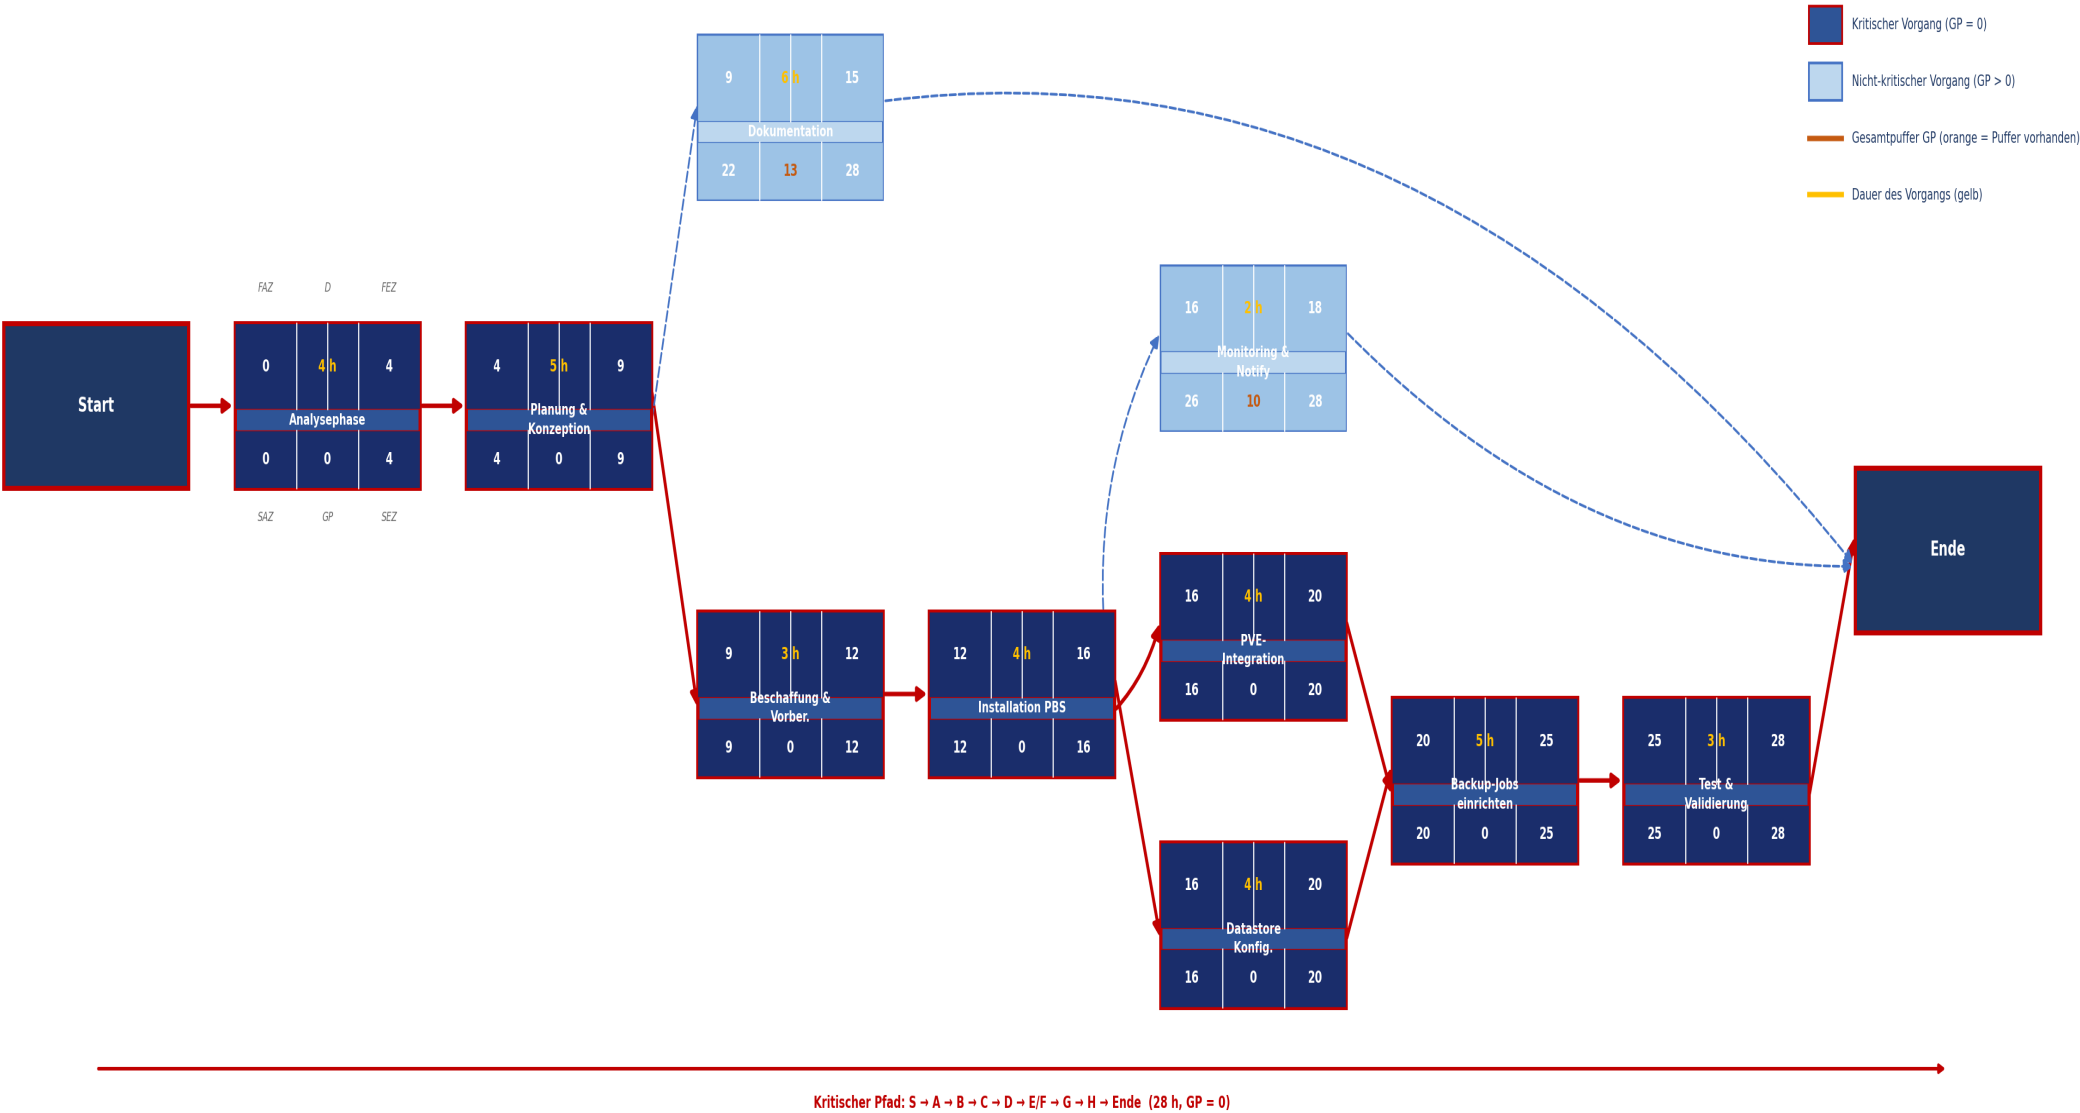

2. Projektablauf – Gantt-Diagramm & Phasenübersicht

Links: Balken auf Stunden-Zeitachse. Gelbe Balken = Puffer (GP). Farbige Bereiche = Parallelphasen. Dreiecke = Meilensteine M1–M6. Rechts: Tabelle mit FAZ, FEZ, SAZ, SEZ, Dauer und GP je Phase.

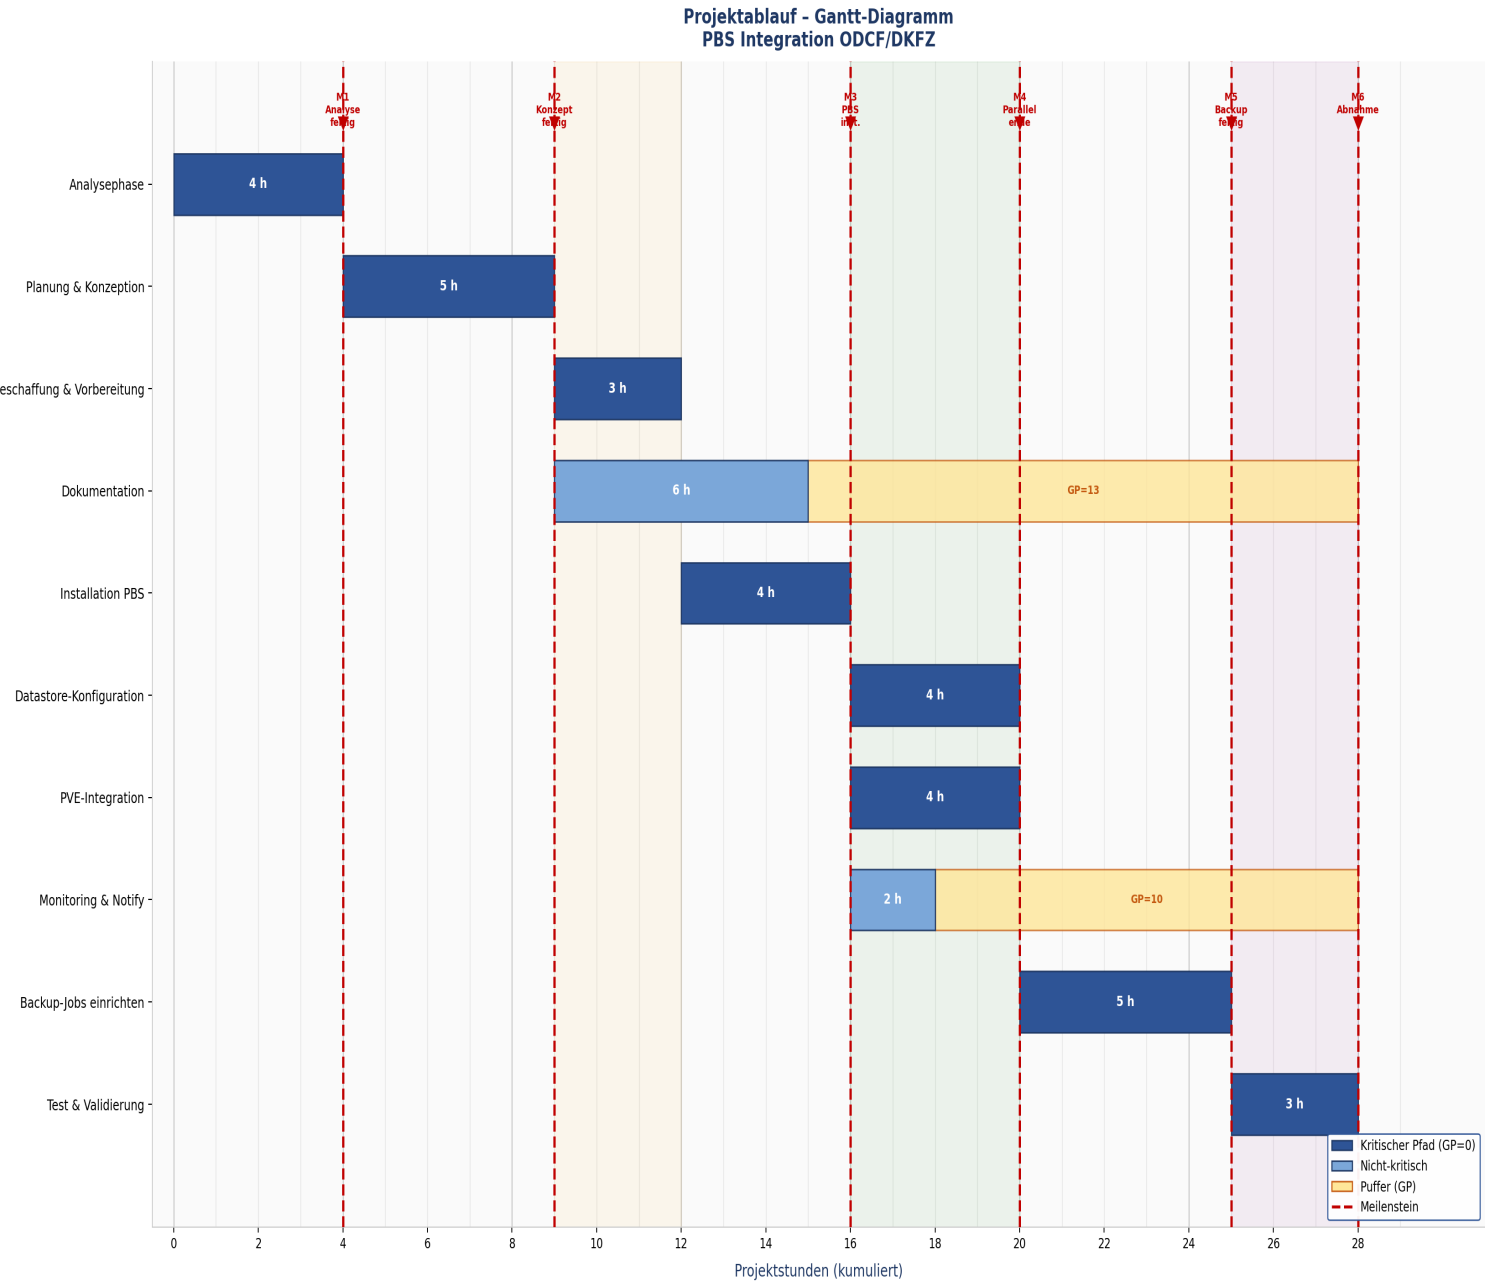

Phasenübersicht mit Terminen

#	Phase	FAZ	FEZ	D	SAZ	SEZ	GP
1	Analysephase	0	4	4h	0	4	✓
2	Planung & Konzeption	4	9	5h	4	9	✓
3	Beschaffung & Vorbereitung	9	12	3h	9	12	✓
4	Dokumentation	9	15	6h	22	28	13h
5	Installation PBS	12	16	4h	12	16	✓
6	Datastore-Konfiguration	16	20	4h	16	20	✓
7	PVE-Integration	16	20	4h	16	20	✓
8	Monitoring & Notify	16	18	2h	26	28	10h
9	Backup-Jobs einrichten	20	25	5h	20	25	✓
10	Test & Validierung	25	28	3h	25	28	✓

3. Belastungsdiagramm – Stunden pro Arbeitstag & kumulierter Verlauf

Oben: gestapelte Tagesbalken mit Stunden je Phase. Zahlen in Segmenten = Stunden dieser Phase am jeweiligen Tag. Rote Linie = 6 h/Tag-Maximum. Orange Linie = Ø 4 h/Tag. Unten: kumulierter Stundenfortschritt vs. Idealverlauf (4 h/Tag gleichmäßig).

